



S.R.O.

Faktúra číslo :

072/800102/15

Objednávka číslo : ZoD č. 8001/13

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SimKor s.r.o.

Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36014354

DIČ: 2020066180

IČ DPH: SK2020066180

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka

č. 3980/S

Banka : VUB pobočka B. Štiavnica Banská Štiavnica

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 045/69 49 111, 116, 117, 121, Fax : 045/6949115

Faktúru vyhotovil : Prefektušová Irena

Odberateľ :

Slovenské banské múzeum

ul. Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Slovenské banské múzeum

ul. Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum
V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Dňa: 11. 05. 2015

Číslo: Pril.:
Zároveň: Vybavi:
Lehota:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.05.2015	06.05.2015	05.06.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1811293059/0200		
IBAN : SK60 0200 0000 0018 1129 3059		
Suma k úhrade : 624 567,95		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
07280010215	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za vykonané práce a dodávky na akcii „REKONŠTRUKCIA STARÉHO ZÁMKU A PRACHÁRNE“ v zmysle ZoD č 8001/2013 zo dňa 12.5.2014 a rozsahu priloženého súpisu :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	145		1,00		520 473,29	624 567,95	20	520 473,29	104 094,66	624 567,95

Základ pre DPH 20 % : 520 473,29

DPH 20 % : 104 094,66

Celková suma s DPH

624 567,95

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

624 567,95

Podpis a pečiatka :



PAY by square



SIMKOR

S. R. O.

Trate Mládeže 9/A

969 00 Banská Štiavnica

IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180

CELKOVÝ ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 16.3.-05.5.2015

Počet príloh: 5

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Miesto:

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			1 479 950,00
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	400 068,90	520 473,29	920 542,19
3.	DPH	80 013,78	20.00 % 104 094,66	184 108,44
4.	Celkom	480 082,68	624 567,95	1 104 650,63
5.	Zádržné		0,00	
6.	Pozastávka		0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		624 567,95	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

S. r. o.
Trate mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 05.05.2015



Celková rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Od: 16.03.2015 **Do:** 05.05.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Dátum: 05.05.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Náklad prestavané k fakturačnému obdobiu bez DPH
1	2	3	4	5	6
001	Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka	520 473,29	104 094,66	624 567,95	400 068,90
1.0	SO 01 Starý zámok	394 881,65	78 976,33	473 857,98	353 831,22
1.1	SO 01 Starý zámok	394 881,65	78 976,33	473 857,98	353 831,22
2.0	SO 02 Pracháreň	125 591,64	25 118,33	150 709,97	46 237,68



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 16.3.-05.5.2015

Číslo faktúry: 072/800102/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

SO 01 Starý zámok

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			956 866,44
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	353 831,22	394 881,65	748 712,87
3.	DPH	70 766,24	20.00 % 78 976,33	149 742,57
4.	Celkom (2+3)	424 597,46	473 857,98	898 455,44

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:



SIMKOR
s. r. o.

Trate Mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354, IČ DPH: SK202006666180

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 05.05.2015



Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Obdobie: 16.3.-05.5.2015

Objekt: SO 01 Starý zámok

Časť: SO 01 Starý zámok

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:

Dátum: 05.05.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							59 090,34	107,004
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							59 010,00	107,000
11	014	612462184	Vnútna omietka stien KEIM POROSAN, sanačná hr.4 cm - umelecko - remeselné prevedenie	m2	1 600,000	26,250	42 000,00	94,400
12	011	612465138	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	2 100,000	8,100	17 010,00	12,600
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							80,34	0,004
24	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	3,000	6,500	19,50	0,000
26	013	968062245	Vybúranie drevených rámov a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,036t	m2	1,250	12,900	16,13	0,002
27	013	968062246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,030t	m2	3,400	13,150	44,71	0,003
PSV Práce a dodávky PSV							335 791,31	9,798
762 Konštrukcie tesárske							305 735,13	8,780
68	762	762372501	Krytina z ručne štiepaného šindľa dvojité	m2	744,500	366,992	273 225,54	6,328
72	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	148,000	31,980	4 733,04	0,000
73	611	6119301000	Dlážkovica hobľovaná na pero - drážku hr. 27 mm	m2	145,440	44,000	6 399,36	2,327
80	762	762526210	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti montáž lišt podláh	m	468,000	38,900	18 205,20	0,000
81	614	6141332000	Lišty BK 9x35 mm	m	505,440	4,650	2 350,30	0,116
82	762	762595000	Podlahy drevené, spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky, impregnácia	m3	3,000	64,800	194,40	0,009
89	762	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	298,710	2,100	627,29	0,000
766 Konštrukcie stolárske							30 056,18	1,018
117	766	766623721	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo dub, pevne zasklené, 1krídl. do 0,90 m2	ks	30,000	41,500	1 245,00	0,058
##	611	6114144401	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 620x540 mm "okno 1"	ks	1,000	358,000	358,00	0,027
##	611	6114144403	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 790x430 mm "okno 3"	ks	1,000	398,000	398,00	0,027
##	611	6114144404	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 920x740 mm "okno 4"	ks	1,000	345,000	345,00	0,027
##	611	6114144405	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 1010x750 mm "okno 5"	ks	1,000	468,000	468,00	0,027
##	611	6114144406	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 1030x750 mm "okno 6"	ks	16,000	466,000	7 456,00	0,428
##	611	6114144407	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 870x870 mm "okno 7"	ks	8,000	523,000	4 184,00	0,214
##	611	6114144409	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé výšky/šírky 1350x960 mm "okno 9"	ks	2,000	556,000	1 112,00	0,053
132	766	766623723	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo dub, otvár...2 krídl. nad 1,45 m2	ks	3,000	34,560	103,68	0,010
##	611	6114155510	Drevené okno EURO IV 68 dvojkridlové otváracé výšky/šírky 1000/1700 mm "okno 10"	ks	3,000	1 987,500	5 962,50	0,148
143	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	468,000	18,000	8 424,00	0,000

Celkom

394 881,65

116,803



Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Objekt: SO 02 Pracháreň

Obdobie: 16.3.-05.5.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:



Dátum: 05.05.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							125 591,64	45,274
2 Zakladanie							29 020,16	28,102
25	002	289211111	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kamenom nakupovan.	m3	6,350	965,400	6 130,29	3,242
26	002	289472214	L Jednovrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	240,000	34,600	8 304,00	23,621
27	002	289901111	Vyčistenie trhlín alebo dutín do 30mm hĺbky 0-150 mm	m	540,000	4,650	2 511,00	0,043
28	002	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	690,000	0,050	34,50	0,145
29	002	289902211	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L líca klen., -0,06300t	m2	66,228	21,800	1 443,77	0,027
30	002	289903122	L Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa stredn., -0,09000t	m2	290,000	36,540	10 596,60	1,024
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							83 978,04	16,225
38	011	611461115	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie prínavosti náterom	m2	76,228	9,650	735,60	0,023
39	014	611462194	Vnútorná omietka stropov KEIM POROSAN, miešaná strojne, nanášaná ručne hr. 3 cm - prevedenie reštaurátorský	m2	76,228	285,700	21 778,34	2,859
40	014	612462184	Vnútorná omietka stien KEIM POROSAN, sanačná hr.4 cm - prevedenie reštaurátorský	m2	202,000	26,250	5 302,50	11,918
41	014	6224631194	Vonkajšia omietka stien KEIM POROSAN sanačná, hr. 4 cm - prevedenie reštaurátorský	m2	88,000	312,600	27 508,80	0,898
42	014	6224631631	Vonkajšia omietka stien renovačná	m2	88,000	325,600	28 652,80	0,528
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 100,94	0,946
49	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	300,600	12,500	3 757,50	0,000
50	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1051	m2	1 063,400	7,846	8 343,44	0,946
99 Presun hmôt HSV							492,50	0,000
70	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,000	9,850	492,50	0,000
Celkom							125 591,64	45,274



Fotodokumentácia k faktúre č. 072/800102/15.

Starý zámok :

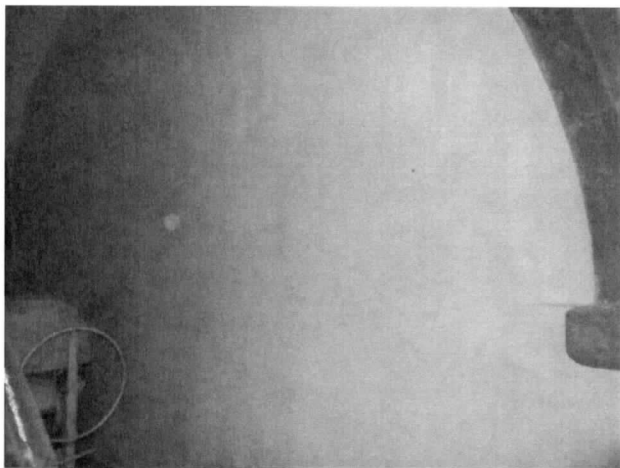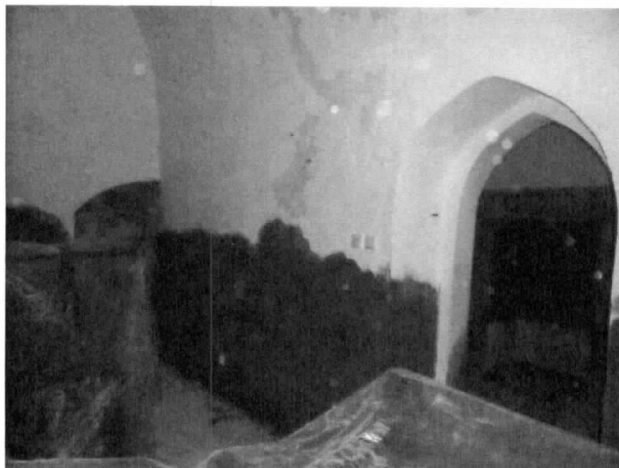


Realizácia omietok stien položky č. 11 a 12.



Handwritten signature.





Vybúranie a vyvesenie okien položky č. 24, 26, 27.

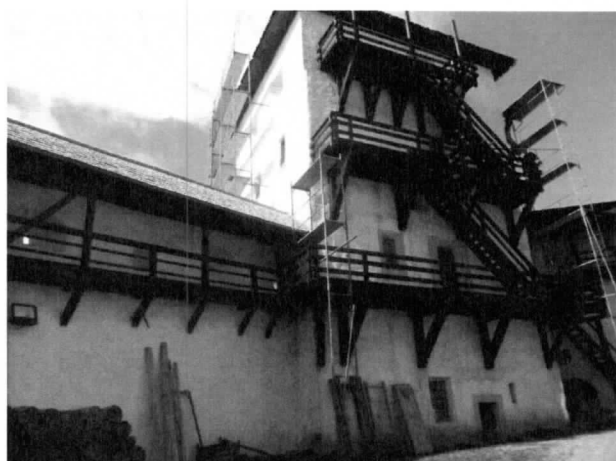




Krytina z ručne štiepaného šindľa položka č. 68.

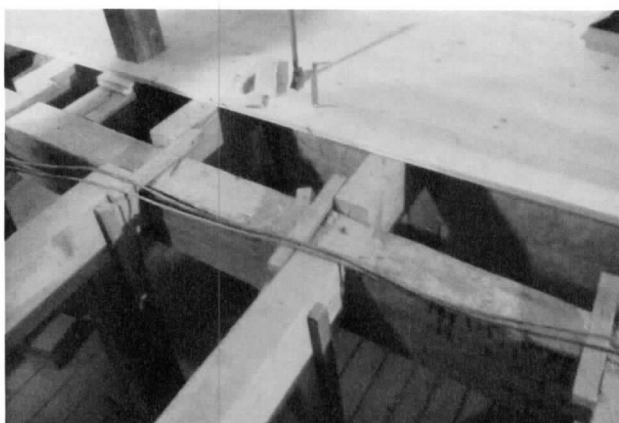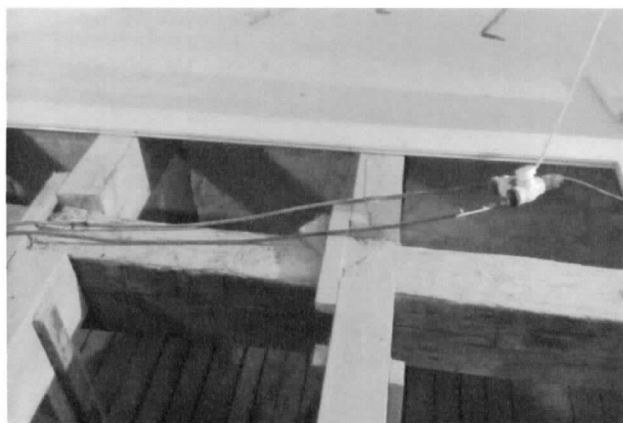

Dodávka a montáž podláh vrátane podkladnej konštrukcie a spojovacích prostriedkov – položky č. 72, 73, 80, 81, 82, 90.




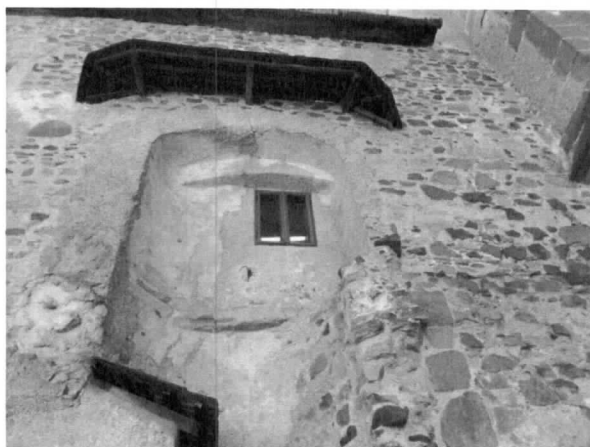

Dodávky a montáž drevených okien – položky č. 117 – 143.




Pracháreň :

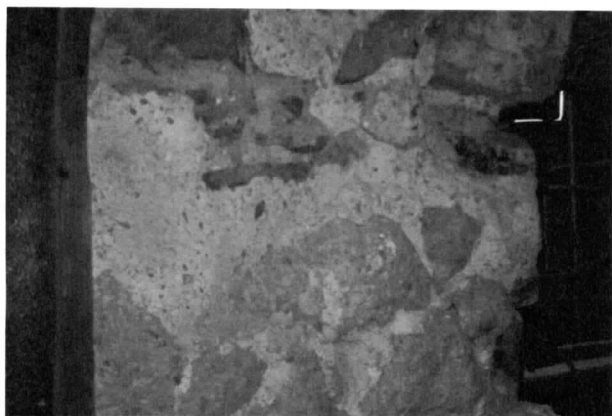

Doplnenie skalnej steny kamenného muriva – položka č. 25



Vyčistenie trhlín alebo dutín – položka č. 27

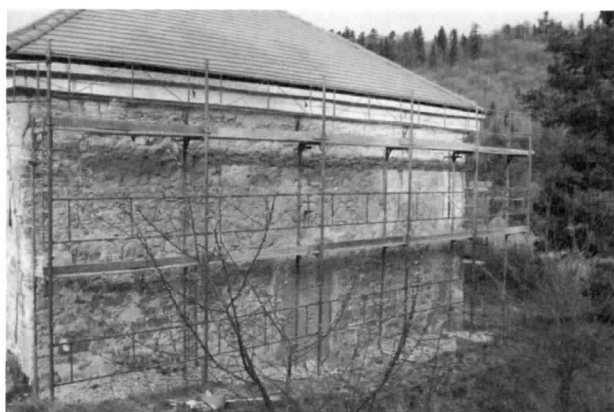

Otlčenie a osekávanie vrstiev omietky a vysekanie spoj. malty položky č. 28, 29, 30.





Vnútorne omietky stropov a stien položky

č. 38, 39, 40.



Vonkajšie omietky a lešenie – položky č. 41, 42, 49, 50.

